





Comune di Montalcino Teatro degli Astrusi

**PROGETTO ESECUTIVO PER IL CONSOLIDAMENTO,
RESTAURO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE**

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1		Installazione di cantiere	09/11/2015	11/11/2015	3
2		Ricollocamento pannelli in poliuretano precedentemente accatastati all'interno dei locali del Teatro	12/11/2015	16/11/2015	5
3		Ricollocamento con integrazione del manto di copertura in coppi e tegoli, precedentemente accatastati nell'area esterna al Teatro.	17/11/2015	30/11/2015	14
4		Sistemazione e ripristino aggetti di gronda, pluviali scossaline, raccordi e altre opere su lattonerie in rame	12/11/2015	24/11/2015	13
5		Smontaggio dei serramenti esterni oggetto di intervento di sostituzione	17/12/2015	18/12/2015	2
6		Spicconatura e ringranatura parziale degli intonaci esterni	25/11/2015	16/12/2015	22
7		Realizzazione di intonaco civile per esterno a calce nelle aree spicconate	01/12/2015	18/12/2015	18
8		Tinteggiature delle facciate esterne	15/01/2016	28/01/2016	14
9		Fornitura e posa in opera di nuovi infissi in sostituzione di quelli precedentemente smontati	17/12/2015	23/12/2015	7
10		Restauro parziale della costolatura in legno dell'estradosso della volta	21/12/2015	29/12/2015	9
11		Ripristino della struttura lignea e dei restanti strati (pavimentazione e controsoffitti in cartongesso) dei solai demoliti per la messa in opera delle strutture provvisoriale	30/12/2015	21/01/2016	23
12		Restauro mediante ripresa delle stuccature e delle modanature in gesso all'interno del salone	04/02/2016	11/02/2016	8
13		Riprese intonaci interni	22/01/2016	01/02/2016	11
14		Tinteggiatura delle pareti interne previa preparazione fondo e successiva stesa di idoneo fissativo	12/02/2016	02/03/2016	20
15		Opere per il trattamento anti-umidità del bagno disabili e relativo disimpegno al piano terra	04/02/2016	08/02/2016	5
16		Sostituzione dei sanitari dei tutti i bagni ai piani	01/02/2016	03/02/2016	3
17		Ripristino impianto elettrico (non continuativo)	23/12/2015	18/01/2016	27
18		Riparazione colonna idrica tra CT e sottotetto	26/01/2016	29/01/2016	4
19		Ripristino impianto di ventilazione	01/02/2016	03/02/2016	3
20		Pulizie e rimozione cantiere	04/03/2016	08/03/2016	5

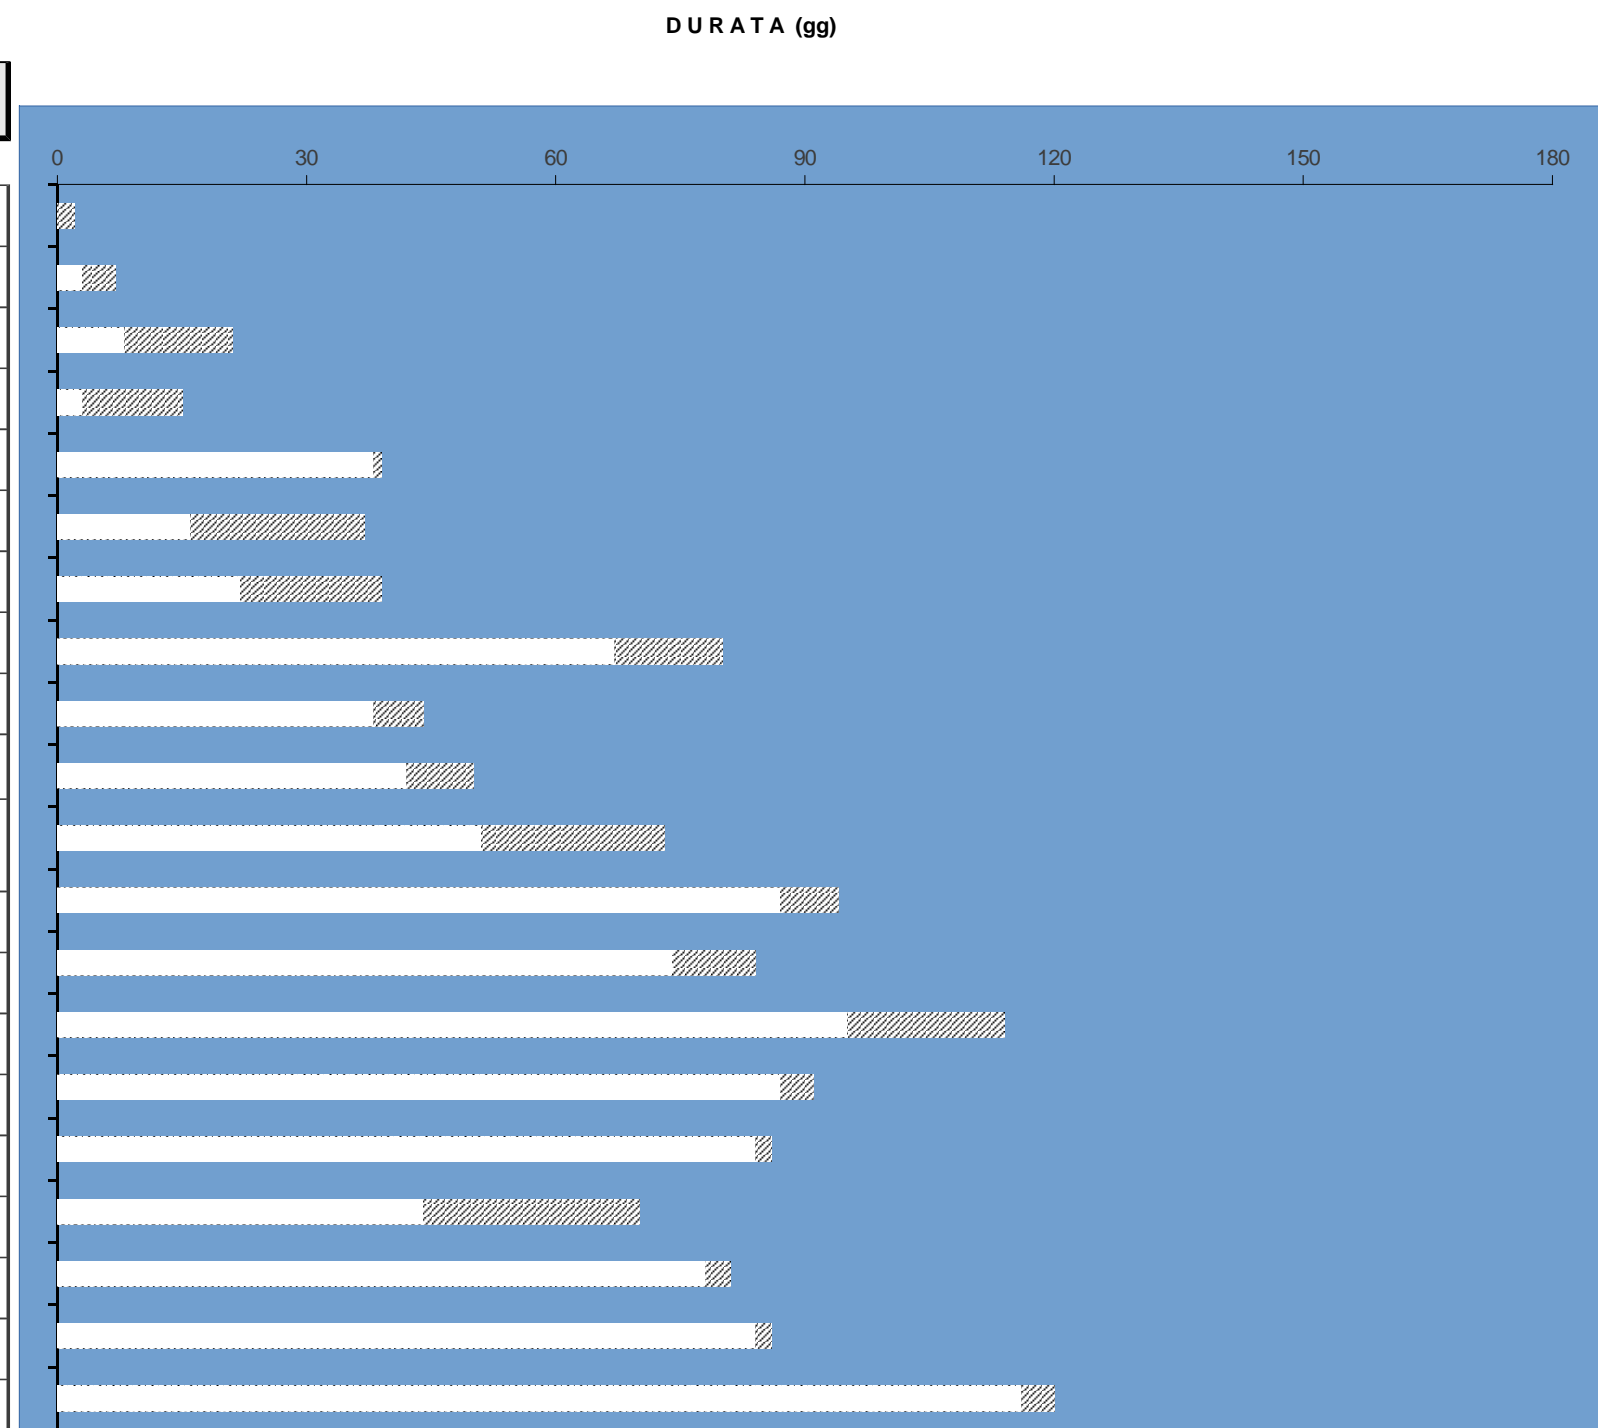

Inizio dei lavori

0 gg

Fine lavori

120 gg

TC

120

gg.

naturali consecutivi
