

# COMUNE DI MONTALCINO

*OGGETTO* : RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNE ED OPERE DI CONSOLIDAMENTO  
NELL'AREA SPORTIVA DI TORRENIERI

*PROPRIETA'* : AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTALCINO

*LOCALITA'* : LOC. TORRENIERI

## RELAZIONE SPECIALISTICA


### CRONOPROGRAMMA








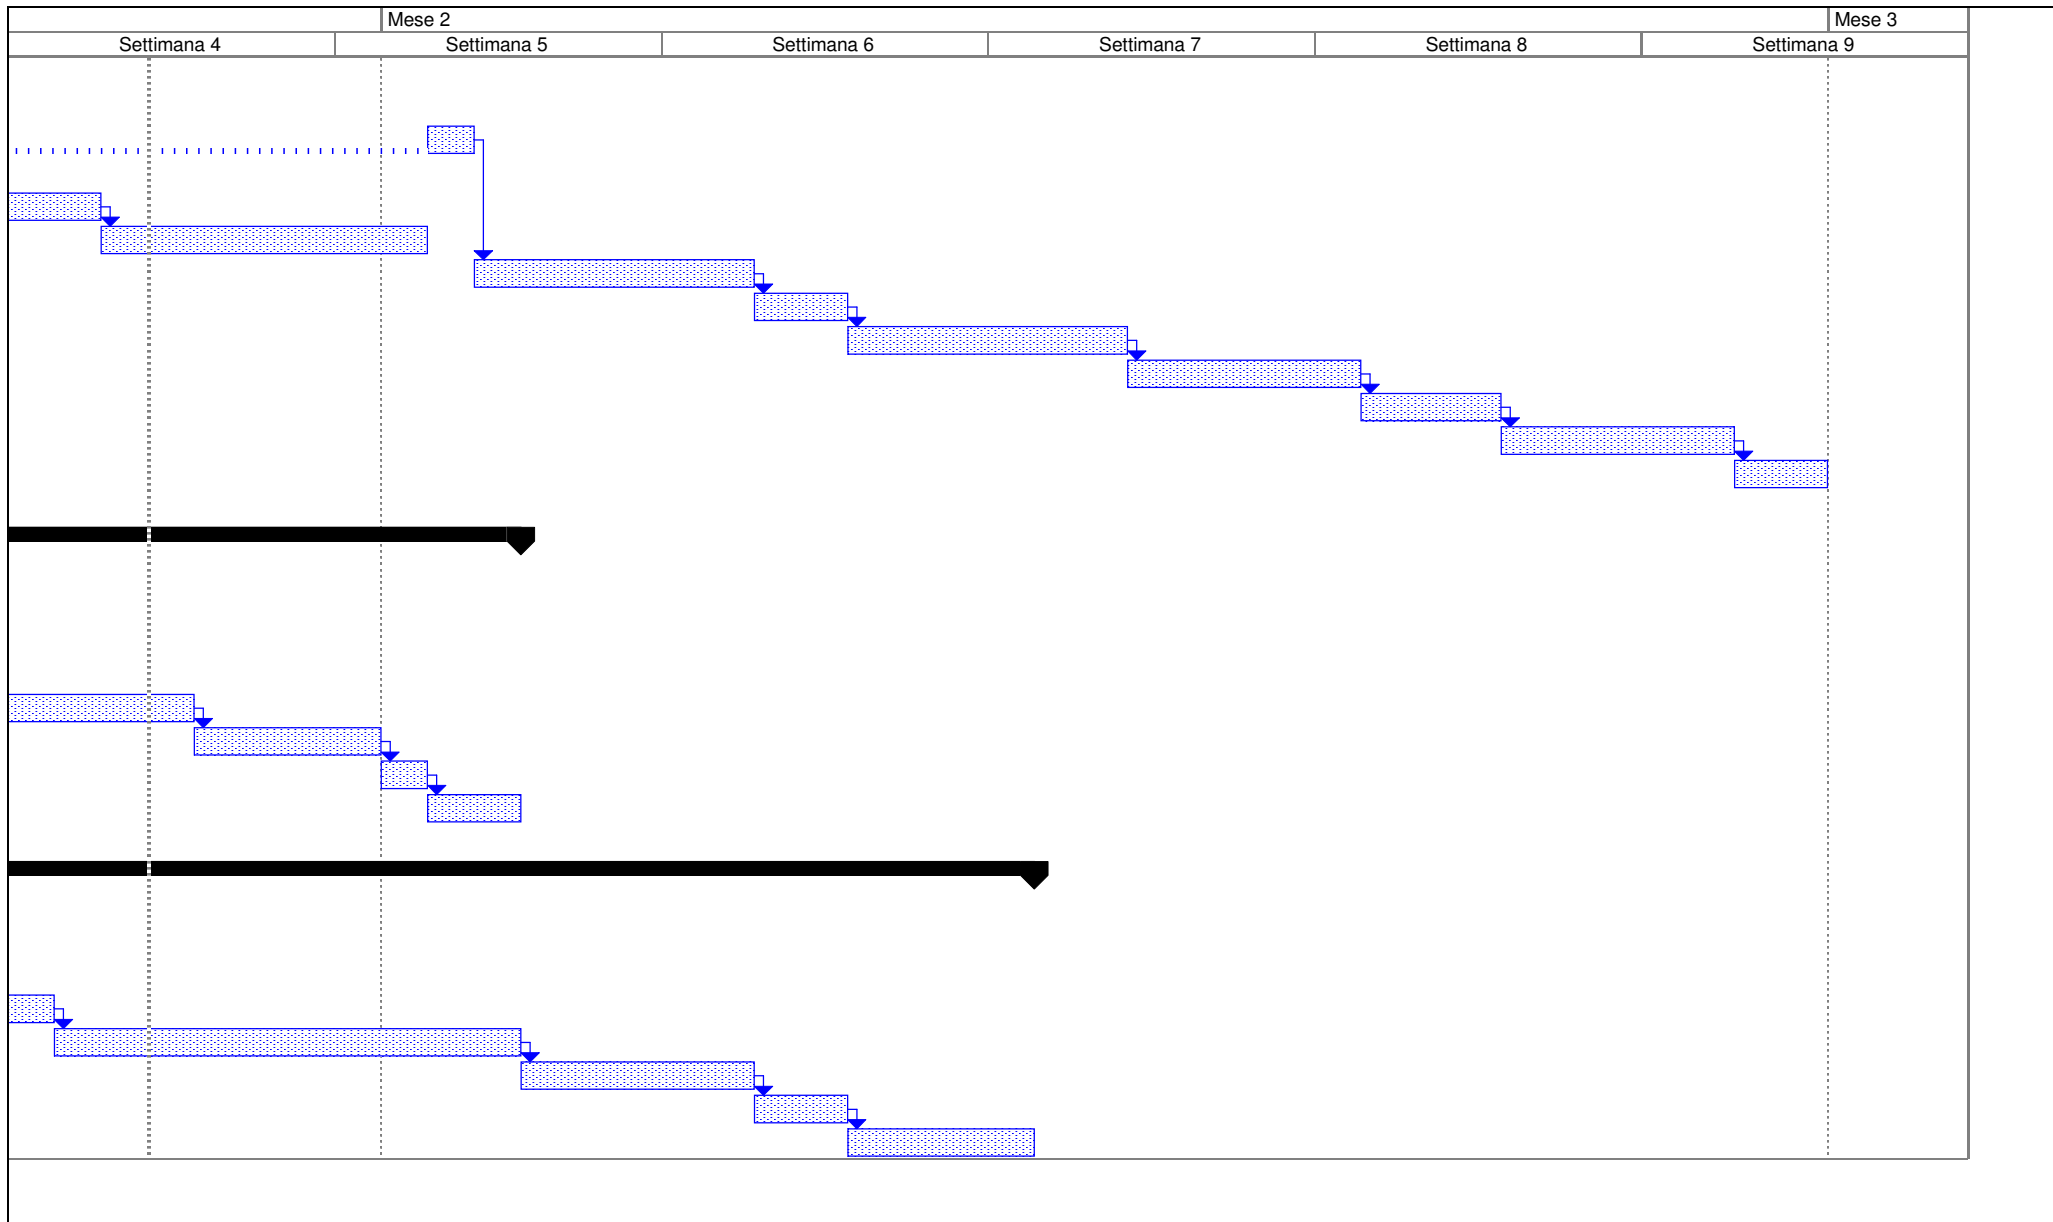

ID	Nome attività	Durata	Predecessori	Mese 1			
				Settimana -1	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3
1	<b>TETTOIA</b>	<b>44 g</b>					
2	ALLESTIMENTO CANTIERE	2 g					
3	MONTAGGIO PONTEGGI	7 g	2				
4	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	5 g					
5	REAL. PILASTRI IN C.A.	4 g					
6	POSA TRAVI E TRAVICELLI	5 g	5				
7	POSA TAVOLATINI LEGNAMI	4 g	3				
8	POSA IMPERMEABILIZZAZIONE	2 g	7				
9	POSA DI LAMIERA GRECCATA	4 g	8				
10	POSA CANALI DI GRONDAMENTO	3 g	9				
11	SMONTAGGIO PONTEGGI	3 g	10				
12	ALLACCIO FOGNATURA	3 g	11				
13	SMANTELLAMENTO CANTIERE	2 g	12				
14							
15	<b>MURO DI SOSTEGNO TIF</b>	<b>24 g</b>					
16	ALLESTIMENTO CANTIERE	2 g					
17	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	3 g	16				
18	SCAVO	4 g	17				
19	REAL. FONDAZIONE	4 g	18				
20	REAL. MURO IN C.A.	6 g	19				
21	REAL. DRENAGGIO	2 g	20				
22	REAL. REINTERRO	1 g	21				
23	SMANTELLAMENTO	2 g	22				
24							
25	<b>MURO DI SOSTEGNO TIF</b>	<b>31 g</b>					
26	ALLESTIMENTO CANTIERE	2 g					
27	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	4 g	26				
28	SCAVO	5 g	27				
29	REAL. FONDAZIONE	5 g	28				
30	REAL. MURO IN C.A.	8 g	29				
31	REAL. DRENAGGIO	3 g	30				
32	REAL. REINTERRO	2 g	31				
33	SMANTELLAMENTO	2 g	32				

Progetto: CRONOPROGRAMMA CAM  
Data: gio 25/02/16

Attività		Cardine		Attività esterne	
Divisione		Riepilogo		Cardine esterno	
Avanzamento		Riepilogo progetto		Scadenza	



Progetto: CRONOPROGRAMMA CAM  
 Data: gio 25/02/16

Attività		Cardine		Attività esterne	
Divisione		Riepilogo		Cardine esterno	
Avanzamento		Riepilogo progetto		Scadenza	
